


Gemeinde Medel Lucmagn
 Ausführungsprojekt
 Erneuerung Gemeindefrassen
 Via Iert la Mola, Via Canduglias
 Bauphasen Baumeisterarbeiten
 Situation 1:250

Aktueller Stand: **13.05.2024**

Plan Nr.	1156-6.50		
Projekt	Lc	Gezeichnet	Lc
Datum	20.03.2024	Format	60/84
Änderungen	13.05.2024		
Freigegeben	13.05.2024 Lc		
M:\01_Projekte\1156-6_Curaglia Via Iert la Mola, Via Canduglias\05_Ausführungsprojekt			



Via Sorte 27 · 7130 Ilanz
 Telefon 081 820 08 20
 info@cavigelli.ch · www.cavigelli.ch

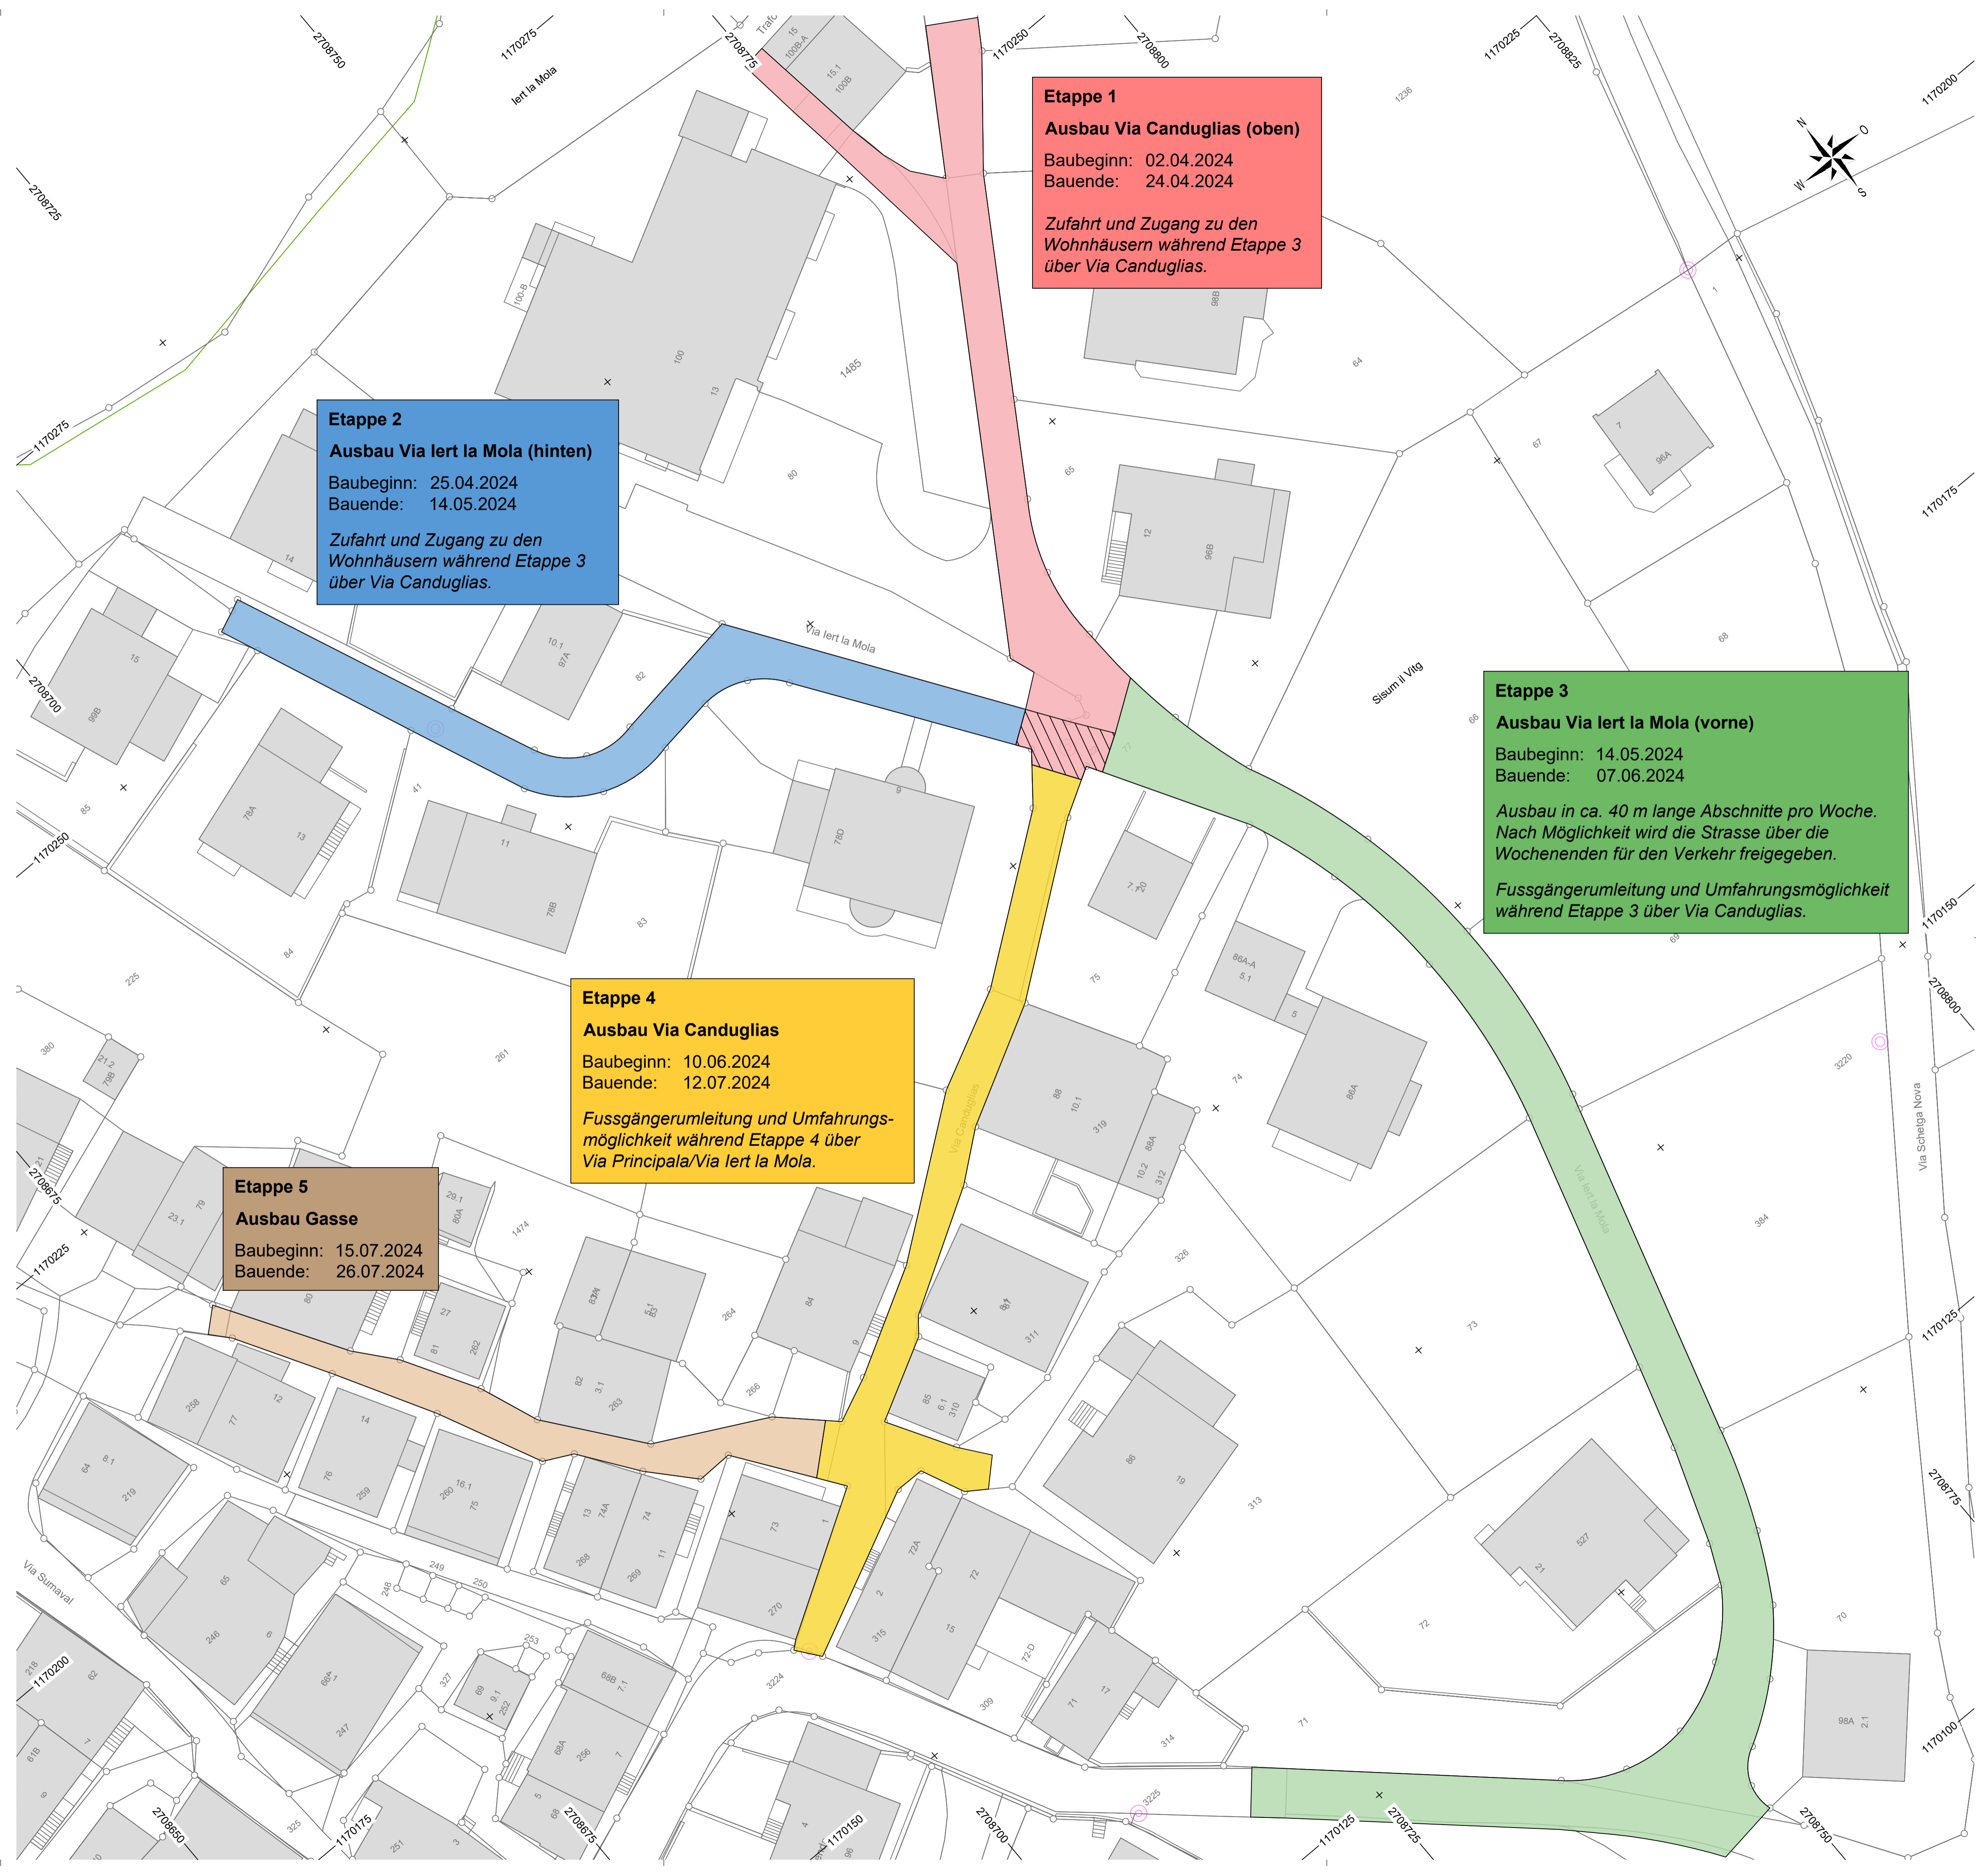

Etappe 1
Ausbau Via Canduglias (oben)
 Baubeginn: 02.04.2024
 Bauende: 24.04.2024
Zufahrt und Zugang zu den Wohnhäusern während Etappe 3 über Via Canduglias.

Etappe 2
Ausbau Via Iert la Mola (hinten)
 Baubeginn: 25.04.2024
 Bauende: 14.05.2024
Zufahrt und Zugang zu den Wohnhäusern während Etappe 3 über Via Canduglias.

Etappe 3
Ausbau Via Iert la Mola (vorne)
 Baubeginn: 14.05.2024
 Bauende: 07.06.2024
Ausbau in ca. 40 m lange Abschnitte pro Woche. Nach Möglichkeit wird die Strasse über die Wochenenden für den Verkehr freigegeben.
Fussgängerumleitung und Umfahrungsmöglichkeit während Etappe 3 über Via Canduglias.

Etappe 4
Ausbau Via Canduglias
 Baubeginn: 10.06.2024
 Bauende: 12.07.2024
Fussgängerumleitung und Umfahrungsmöglichkeit während Etappe 4 über Via Principala/Via Iert la Mola.

Etappe 5
Ausbau Gasse
 Baubeginn: 15.07.2024
 Bauende: 26.07.2024
